

Indice: 02681X0105

Désignation: P3

Commune: MEREVILLE (54)

Date fin de travaux: 01/09/1976

Lieu-dit: PATIS DU PONT - PUIITS 3

Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

Nature : PUIITS

Pompage d'essai PP, PLD 28/09/1976, 30/09/1976

X : 881,39 km

Débit spécifique : 97,82, 97,9 m²/h

Y : 106,877 km


Piézométrie indicative (28/09/1976)

Transmissivité : 0,01, 0,01 m²/s

Z : 225 m (coupe : m)

Profondeur d'eau : 0,86 m/sol

Perméabilité : , m/s

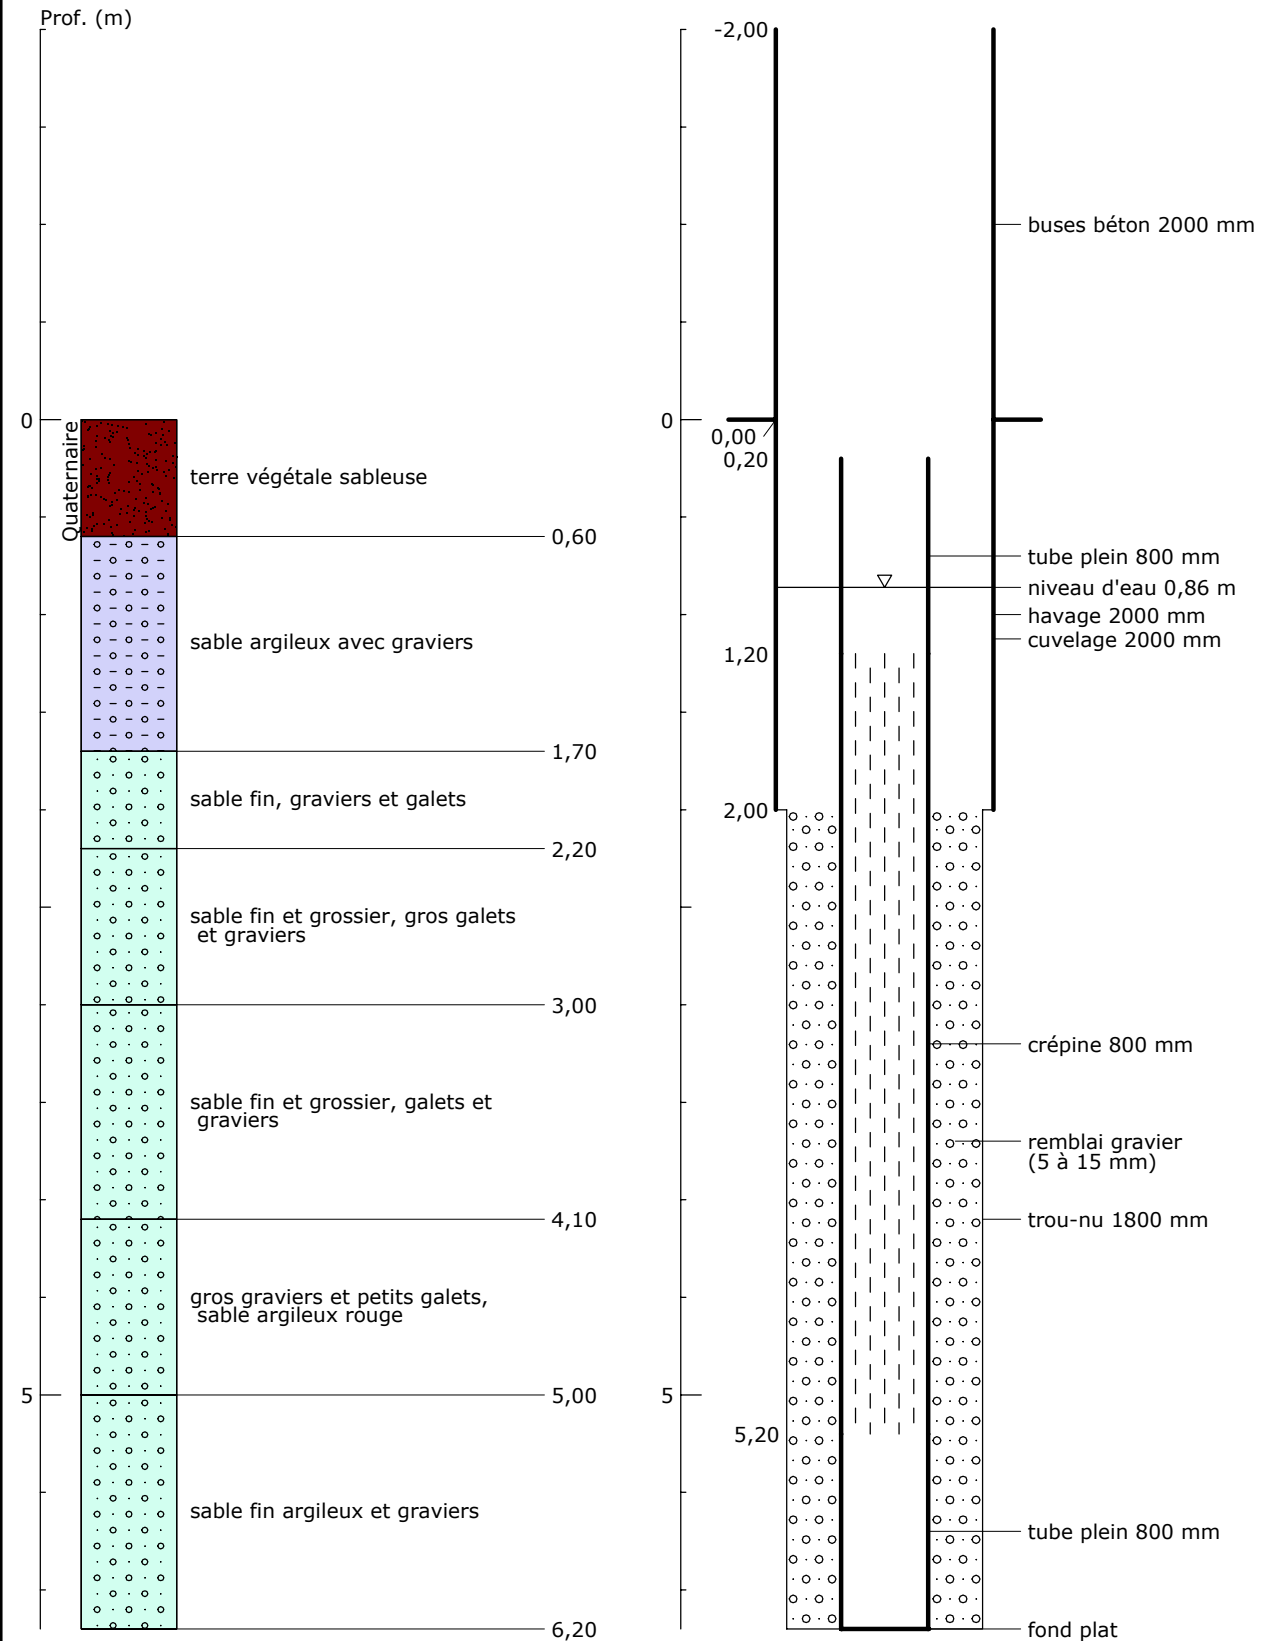

6,20
